Bauherrschaft:

Planungs- und Bauprogramm
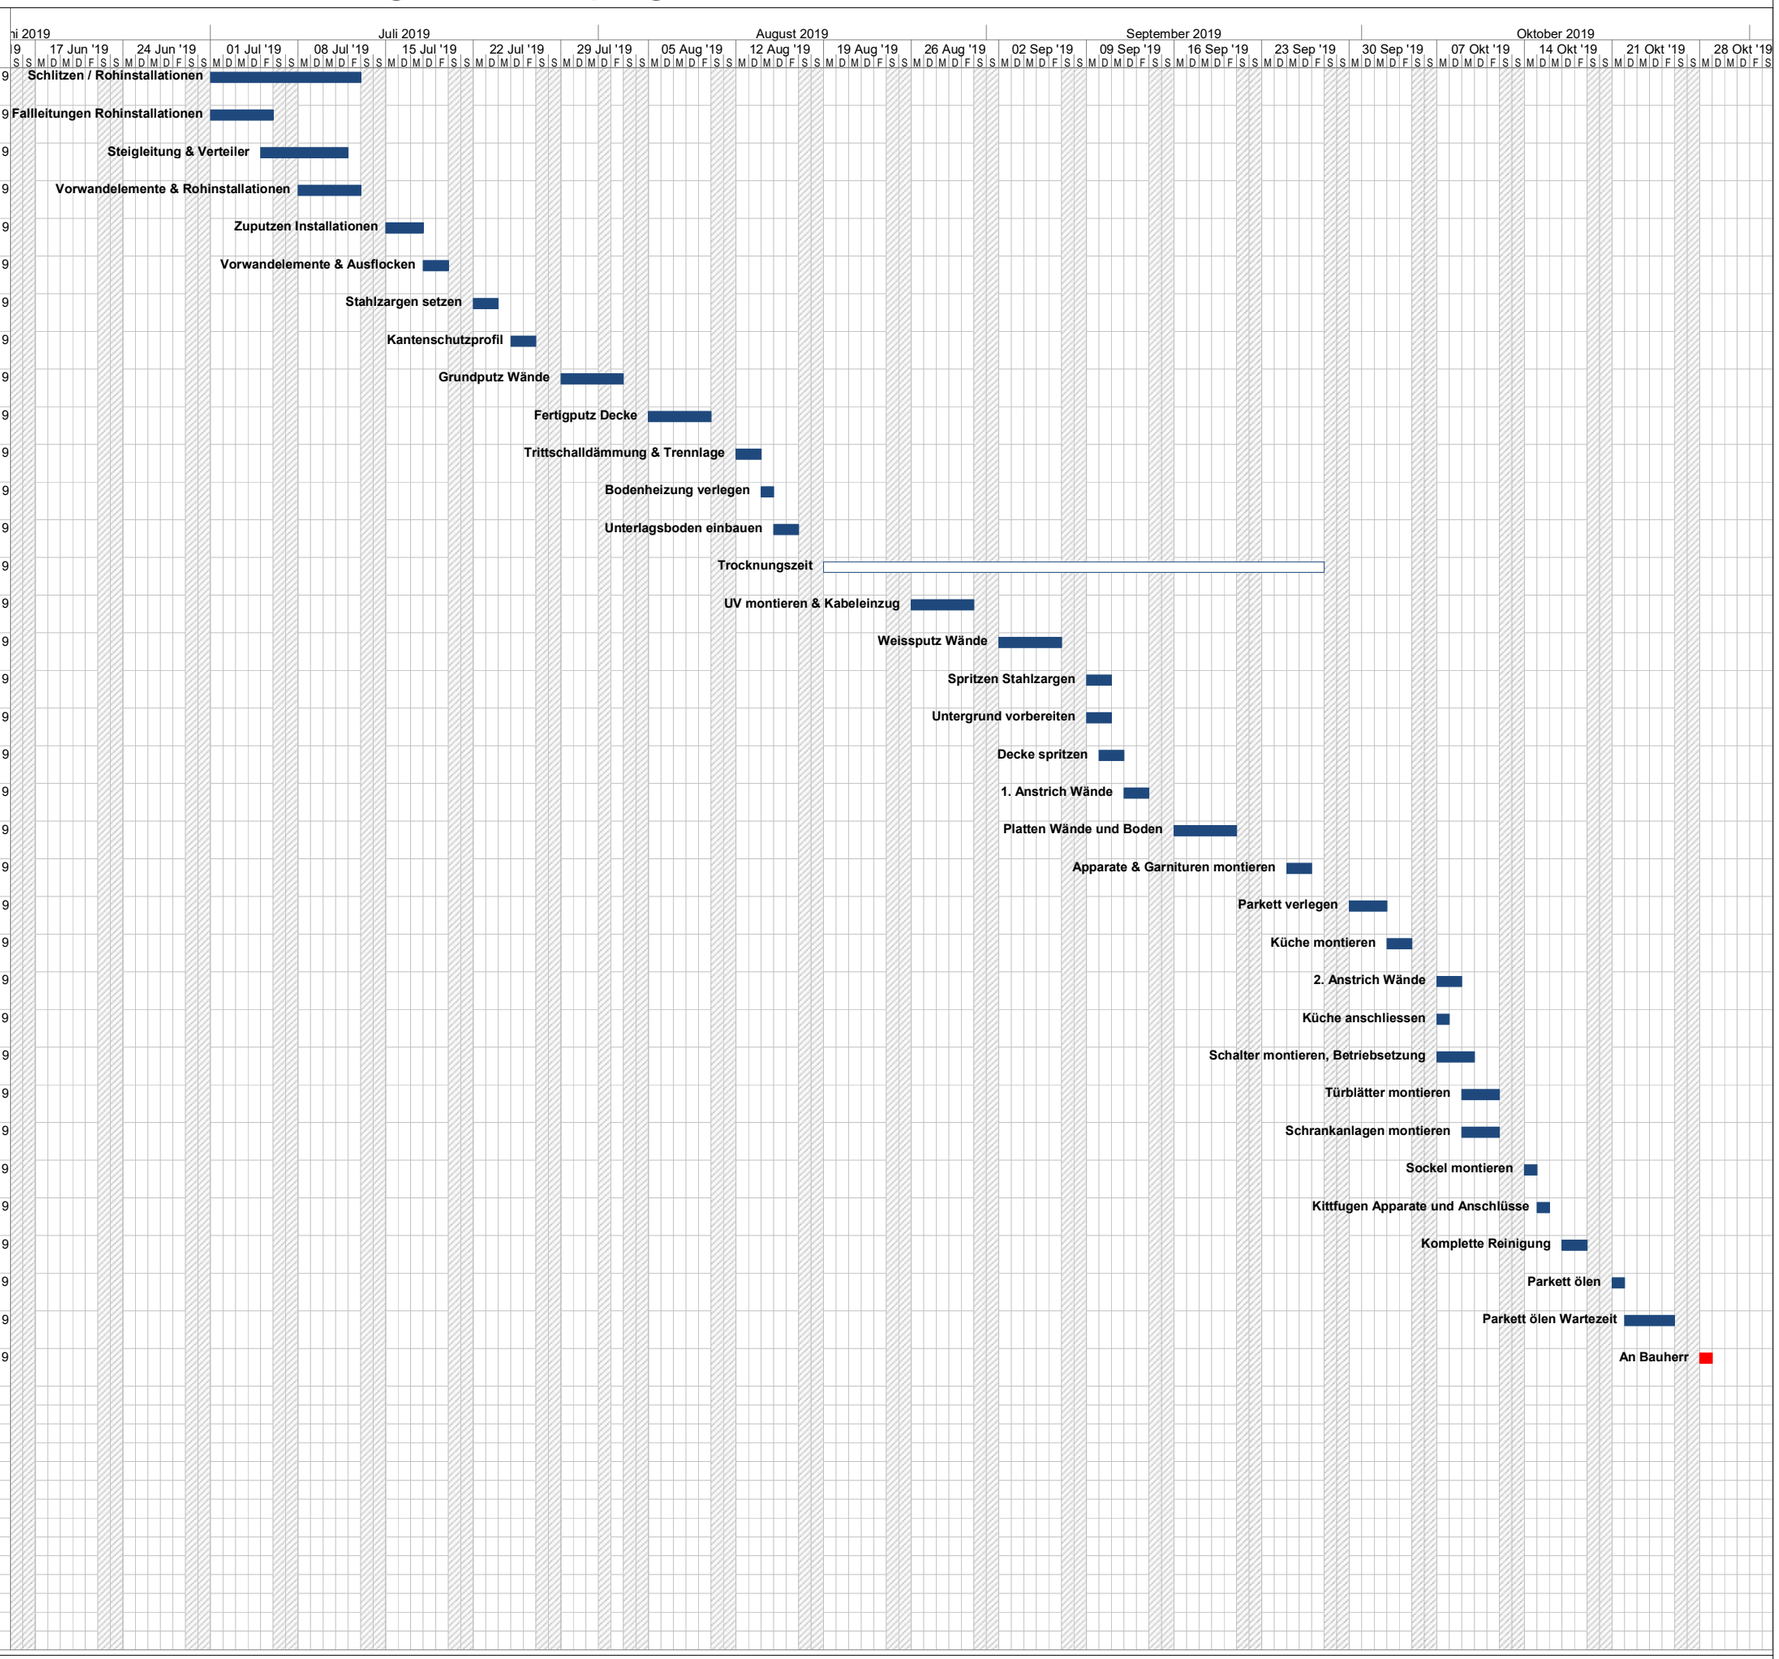
Nr.	Text5	Text2	Text29	Name	Dauer	Anfang	Ende
1	230	Elektroinstallationen	Unternehmer 1	Schlitzen / Rohinstallationen	10 Tage	Mon 01.07.19	Fre 12.07.19
3	250	Sanitär	Unternehmer 3	Steig- Fallleitungen Rohinstallationen	5 Tage	Mon 01.07.19	Fre 05.07.19
2	240	Heizung	Unternehmer 2	Steigleitung & Verteiler	5 Tage	Fre 05.07.19	Don 11.07.19
4	250	Sanitär	Unternehmer 3	Vorwandelemente & Rohinstallationen	5 Tage	Mon 08.07.19	Fre 12.07.19
6	211	Baumeister	Unternehmer 4	Zuputzen Installationen	3 Tage	Mon 15.07.19	Mit 17.07.19
5	250	Sanitär	Unternehmer 3	Vorwandelemente & Ausflocken	2 Tage	Don 18.07.19	Fre 19.07.19
7	273.0	Türen	Unternehmer 5	Stahlzargen setzen	2 Tage	Mon 22.07.19	Die 23.07.19
8	271	Gipser	Unternehmer 6	Kantenschutzprofil	2 Tage	Don 25.07.19	Fre 26.07.19
9	271	Gipser	Unternehmer 6	Grundputz Wände	4 Tage	Mon 29.07.19	Fre 02.08.19
10	271	Gipser	Unternehmer 6	Fertigputz Decke	5 Tage	Mon 05.08.19	Fre 09.08.19
11	281	Unterlagsboden	Unternehmer 7	Trittschalldämmung & Trennlage	2 Tage	Mon 12.08.19	Die 13.08.19
12	240	Heizung	Unternehmer 2	Bodenheizung verlegen	1 Tag	Mit 14.08.19	Mit 14.08.19
13	281	Unterlagsboden	Unternehmer 7	Unterlagsboden einbauen	2 Tage	Don 15.08.19	Fre 16.08.19
14	281	Unterlagsboden	Unternehmer 7	Trocknungszeit	30 Tage	Mon 19.08.19	Fre 27.09.19
15	230	Elektroinstallationen	Unternehmer 1	UV montieren & Kabeleinzug	5 Tage	Mon 26.08.19	Fre 30.08.19
16	271	Gipser	Unternehmer 6	Weissputz Wände	5 Tage	Mon 02.09.19	Fre 06.09.19
17	285	Maler	Unternehmer 8	Spritzen Stahlzargen	2 Tage	Mon 09.09.19	Die 10.09.19
18	285	Maler	Unternehmer 8	Untergrund vorbereiten	2 Tage	Mon 09.09.19	Die 10.09.19
19	285	Maler	Unternehmer 8	Decke spritzen	2 Tage	Die 10.09.19	Mit 11.09.19
20	285	Maler	Unternehmer 8	1. Anstrich Wände	2 Tage	Don 12.09.19	Fre 13.09.19
24	282	Plattenarbeiten	Unternehmer 10	Platten Wände und Boden	5 Tage	Mon 16.09.19	Fre 20.09.19
29	250	Sanitär	Unternehmer 3	Apparate & Garnituren montieren	2 Tage	Mit 25.09.19	Don 26.09.19
22	281.7	Bodenbelag Holz	Unternehmer 9	Parkett verlegen	3 Tage	Mon 30.09.19	Mit 02.10.19
27	258	Küchenbauer	Unternehmer 11	Küche montieren	2 Tage	Don 03.10.19	Fre 04.10.19
21	285	Maler	Unternehmer 8	2. Anstrich Wände	2 Tage	Mon 07.10.19	Die 08.10.19
30	250	Sanitär	Unternehmer 3	Küche anschliessen	1 Tag	Mon 07.10.19	Mon 07.10.19
31	230	Elektroinstallationen	Unternehmer 1	Schalter montieren, Betriebsetzung	3 Tage	Mon 07.10.19	Mit 09.10.19
26	273.0	Türen	Unternehmer 5	Türblätter montieren	3 Tage	Mit 09.10.19	Fre 11.10.19
28	273.3	Allg. Schreiner	Unternehmer 12	Schrankanlagen montieren	3 Tage	Mit 09.10.19	Fre 11.10.19
25	281.7	Bodenbelag Holz	Unternehmer 9	Sockel montieren	1 Tag	Mon 14.10.19	Mon 14.10.19
32	225	Kittfugen	Unternehmer 13	Kittfugen Apparate und Anschlüsse	1 Tag	Die 15.10.19	Die 15.10.19
33	287	Reinigung	Unternehmer 14	Komplette Reinigung	2 Tage	Don 17.10.19	Fre 18.10.19
23	281.7	Bodenbelag Holz	Unternehmer 9	Parkett ölen	1 Tag	Mon 21.10.19	Mon 21.10.19
34	281.7	Bodenbelag Holz	Unternehmer 9	Parkett ölen Wartezeit	4 Tage	Die 22.10.19	Fre 25.10.19
35	0	Übergabe		An Bauherr	1 Tag	Mon 28.10.19	Mon 28.10.19
